

永嘉县瓯北第五小学扩建工程 水土保持设施验收报告

建设单位：永嘉县瓯北第五小学

咨询单位：浙江立诚水利工程技术有限公司

二〇一八年八月



永嘉县瓯北第五小学扩建工程 水土保持设施验收报告

审查：林善

校核：沈德录

编写：薛子、黄兆业

建设单位：永嘉县瓯北第五小学

咨询单位：浙江立诚水利工程技术有限公司

二〇一八年八月

前言

1.项目背景:

近年来,瓯北社会经济迅速发展,特别是随着城市化进程的加速,房地产迅猛发展,户籍制度的改革,加快了瓯北人口集聚,给瓯北教育带来前所未有的压力。特别是(礁头片)东瓯工业园区三期工业区的建成,人口的集聚,学龄儿童的增加,使本来已经规划好的第五小学带来校舍、校园用地面积的严重不足。为使第五小学教育与(礁头片)东瓯工业区发展相配套,必须扩建瓯北镇第五小学。为此,镇政府研究决定,结合已完成的(礁头片)东瓯工业区三期规划,将现有校园面积扩大到 41.63 亩,并根据实际需要、实际情况提出第五小学扩建项目,建成后,其办学规模将达到 30 个班级,学生人数 1350 人。

2.项目立项情况:

2012年1月永嘉县发改局以永发改审(2012)4号文做出了《关于瓯北第五小学二期扩建工程初步设计的批复》。

3.建设过程

工程设计单位为浙江天然建筑设计有限公司;施工单位由温州浙南建设集团有限公司负责实施;监理单位为中国建筑技术集团有限公司;工程竣工后,运行管护单位为永嘉县瓯北第五小学。

永嘉县瓯北第五小学扩建工程建设项目于2015年12月开工建设,并于2018年4月完工。

4.自验情况

建设单位在工程建设中积极配合永嘉县水利局对现场的多次水土保持监督检查工作。对专家提出的各项指导性意见和建议,均认真学习并及时调整施工细节,取得了有效的水土流失治理经验。

目前,工程水土保持措施已经基本完成,经施工质量评定、监理评定、建设单位自查初验,工程整体质量验收合格。至此,本工程防治责任范围内的水土流失基本得到控制,水土流失防治目标达到三级

标准。扰动土地整治率达到 100%，水土流失总治理度达 100%；已实施的水土保持措施继续发挥水土保持效益，工程区平均土壤侵蚀模数降至 $500t/(km^2.a)$ 以下，土壤流失控制比达 1.0；工程区范围内不进行临时堆渣，工程拦渣率达标；工程区林草植被恢复率达 100%，林草覆盖率达 23.38%。

工程建设过程中加强了施工管理和水土流失防治工作，要求施工单位按照水土保持方案合理组织施工，采取工程、植物和临时防护相结合的水土保持措施布局，并充分考虑永临结合，最大程度地减少工程建设过程中的水土流失，收到了良好的治理效果。同时建设单位积极配合各级水利行政主管部门的监督检查和管理，虚心接受检查中提出的整改意见，并缴纳了水土保持补偿费（见附件 3）。

经建设单位对本工程水土保持设施进行自查自验，认为本工程水土保持设施从技术上达到了竣工验收条件和要求，特编写了《永嘉县瓯北第五小学扩建工程水土保持设施验收报告》。

水土保持设施验收特性表

验收工程名称	永嘉县瓯北第五小学 扩建工程		验收工程地点	永嘉县	
验收工程性质	扩建		所属流域水系	太湖	
项目规模	总用地面积 2.94hm ²		工程总投资（万元）	2388	
方案审批部门、文号及时间			永嘉县水利局“永水利（2012）198号”2012年7月30日		
工期	主体工程		2015年12月~2018年4月		
水土流失 防治责任范围	方案确定的防治责任范围		3.33hm ²		
	实际扰动和影响范围		3.33hm ²		
	申请验收范围		3.33hm ²		
	验收后防治责任范围		2.94hm ²		
方案确定 的水土流 失防治目 标	扰动土地整治率	95%	水土流 失防治 目标实 现值	扰动土地整治率	100%
	水土流失总治理度	88%		水土流失总治理度	100%
	土壤流失控制比	≥1.0		土壤流失控制比	≥1
	拦渣率	95%		拦渣率	99.9%
	林草植被恢复率	98%		林草植被恢复率	100%
	林草覆盖率	23%		林草覆盖率	23.38%
工程量	工程措施	表土剥离 3500m ³ ，表土回填 3500m ³ ，弃渣外运 2200m ³ ，场地平整 3400m ² ；			
	植物措施	撒播狗牙根草籽 0.2hm ² ；			
	临时措施	临时排水沟 410m，简易排水沟 138m，临时沉砂池 2 座，泥浆沉淀池 5 个，水泵系统 2 套，砌砖墙 80m，彩条布遮盖 400m ² ，填土编织袋拦挡 220m			
工程质量 评定	评定项目	总体质量合格		外观质量	
	工程措施	合格		合格	
	植物措施	合格		合格	
	临时措施	合格		合格	
投资	水土保持方案投资	169.68 万元（含主体已计列）			
	实际投资	161.68 万元（含主体已计列）			
	投资变化原因	结合工程实际情况，因工程水土保持监测工作由建设单位自行监测，故监测费用减少。			
工程总体	水土保持设施建设符合国家水土保持法律、法规及规范要求，各项工程质量合格，工程质量总体达到了验收标准，可以组织竣工验收。				
方案编制	永嘉县水利水电勘测设计院		施工单位	温州浙南建设集团有限公司	
技术咨询	浙江立诚水利工程技术有限公司		监理单位	中国建筑技术集团有限公司	
地址	温州市鹿城区学院东路大自然华城 9 幢 801 室		运行管护	永嘉县瓯北第五小学	
邮编	325000		建设单位	永嘉县瓯北第五小学	
联系人	薛子		联系人	麻锦勉	
电话	15058758766		电话	18267886966	
传真	—		邮编	325100	

目 录

前言.....	I
1 项目及项目区概况.....	1
1.1 项目概况.....	1
1.2 项目区概况.....	4
2 水土保持方案和设计情况.....	6
2.1 主体工程设计.....	6
2.2 水土保持方案编报审批及后续设计.....	6
2.3 水土流失防治责任范围.....	6
2.4 水土流失防治目标.....	6
2.5 水土保持措施和工程量.....	6
2.6 水土保持投资.....	8
2.7 水土保持变更.....	8
3 水土保持方案实施情况.....	9
3.1 水土流失防治责任范围.....	9
3.2 取（弃）土场.....	9
3.3 水土保持措施总体布局.....	10
3.4 水土保持设施完成情况.....	10
3.5 水土保持投资完成情况.....	11
4 水土保持工程质量.....	13
4.1 质量管理体系.....	13
4.2 各防治分区水土保持工程质量评价.....	18
4.3 总体质量评价.....	21
5 工程初期运行及水土保持效果.....	22
5.1 运行情况.....	22
5.2 水土保持效果.....	22
6 水土保持管理.....	24

6.1	组织领导.....	24
6.2	规章制度.....	24
6.3	建设过程.....	26
6.4	监测监理.....	27
6.5	水行政主管部门监督检查意见落实情况.....	27
6.6	水土保持补偿费缴纳情况.....	27
6.7	水土保持设施管理维护.....	27
7	结论及下阶段工作安排.....	29
7.1	自验结论.....	29
7.2	下阶段工作安排.....	29

附件:

- (1) 初步设计的批复;
- (2) 水土保持方案批复;
- (3) 水土保持补偿费缴纳依据;
- (4) 重要水土保持单位工程自验核查照片。

附图:

- (1) 项目区地理位置图;
- (2) 水土流失防治责任范围及防治措施布置图;
- (3) 工程建设前后遥感卫星图。

1 项目及项目区概况

1.1 项目概况

1.1.1 地理位置

永嘉县瓯北第五小学扩建工程位于永嘉县瓯北东瓯街道和一村，地块东南侧为园区大道，东北侧为已有水泥路，西北侧为居民区。

1.1.2 主要技术经济指标

建设规模：本项目为永嘉县瓯北第五小学扩建工程，总规划用地面积29386.79m²，总建筑面积15482.49m²，容积率0.847，绿地率为22.1%；项目主要经济技术指标表见表1-1。

表 1-1 工程经济技术指标一览表

序号	名称		单位	数量
1	总用地面积		m ²	29386.79
	其中	教学用地面积	m ²	18278.29
		道路代征面积	m ²	1633
		活动用地面积	m ²	9475.6
2	规模	班数	班	30
3	建筑占地面积		m ²	4689.5
	其中	一期已建建筑占地	m ²	1949.23
		二期拟建建筑占地	m ²	1831.4
		三期拟建建筑占地	m ²	908.87
4	总建筑面积		m ²	15482.49
	其中	一期已建建筑	m ²	6015.38
		二期拟建建筑	m ²	5659.64
		三期拟建建筑	m ²	3807.47
5	容积率			0.847
6	建筑密度		%	25.7
7	绿地率		%	22.1
8	机动车泊位		辆	9
9	非机动车泊位		辆	295

1.1.3 项目组成及布置

西面中心区设有综合楼、2#教学楼、1#教学楼，由南至北依次布置，相间采用连廊连接，围合成院落，(其中1#教学楼为一期工程，现已建设完成)校区北侧为食堂餐厅、配电房、科技楼、体育馆，由

西至东依次布置中食堂餐厅、科技楼为一期工程，现已建设完成)每幢楼均设有两部楼梯，且每单幢楼均配有卫生间供本幢楼使用。办学规模为30班；其中综合楼共四层，层高均为3.6m，室内外高差0.45m，底部架空活动2.15米，一层为队室、科技活动室、办公室等，局部为校史展览馆。二三层为会议室及办公室，四层为工会活动室、党员活动室及教室电子阅览室。

1#教学楼共四层，层高均为3.6m，室内外高差0.45m，底部架空活动2.15米，一三层均设有5个普通教室，共15个班级，四层设有4个兴趣小组教室体育馆共三层，一层为活动室，层高4.5米，二层为阅览室，层高4.5米三层为室内篮球场，层高9m，局部设夹层，层高3.6米，大空间设计，屋顶为网架结构。

1.1.4 施工组织及工期

项主体工程施工，以连续、平行、协调为原则，综合考虑各施工工区之间的施工组织，协调各工区的施工先后顺序，以确保工程能按规划工期顺利完工。本工程由永嘉县瓯北第五小学负责具体实施，实行统一规划和统一建设，施工管理贯穿施工全过程。

永嘉县瓯北第五小学扩建工程建设项目于2015年12月开工建设，并于2018年4月完工。

1.1.5 工程投资

永嘉县瓯北第五小学扩建工程总投资2388万元，资金由建设单位永嘉县瓯北第五小学通过永嘉县财政拨款和瓯北政府筹措解决。

1.1.6 工程相关建设单位

建设单位：永嘉县瓯北第五小学；

设计单位：浙江天然建筑设计有限公司；

方案编制：永嘉县水利水电勘查设计院；

施工单位：温州浙南建设集团有限公司；

监理单位：中国建筑技术集团有限公司；

运行单位：永嘉县瓯北第五小学。

表1-2 工程参建单位情况一览表

单位类别	单位名称	工作内容和范围
建设单位	永嘉县瓯北第五小学	工程建设
设计单位	浙江天然建筑设计有限公司	工程设计
水土保持方案编制单位	永嘉县水利水电勘测设计院	水土保持方案编制
主体工程监理单位 (含水土保持)	中国建筑技术集团有限公司	工程监理
水土保持工程施工单位	温州浙南建设集团有限公司	工程施工
运行单位	永嘉县瓯北第五小学	运行管护

1.1.7 工程占地

本工程建设占地面积共计2.94hm²，均为永久占地。具体见下表。

表1-3 工程征占地面积表 单位：hm²

项目	耕地	园地	林地	草地	商服用地	水城及水利设施用地	交通运输	公共服务用地	住宅用地	其他土地		合计
										空地	裸地	
工程区								1.27		1.67	2.94	2.94
合计								1.27		1.67	2.94	2.94

1.1.8 土石方情况

根据本工程土石方平衡分析，工程开挖土石方总量 0.62 万 m³（自然方，下同），其中表土剥离 0.35 万 m³，建筑垃圾 0.05 万 m³，桩基泥浆 0.22 万 m³；填筑总量 2.05 万 m³，其中场地标高回填 1.70 万 m³，绿化覆土回填 0.35 万 m³，填筑料全部从合法料场购买；最终产生弃渣总量为 0.22 万 m³。弃渣弃土运至和一村鱼池场地填方综合利用，不设置弃渣场。

1.1.9 拆迁（移民）安置与专项设施改（迁）建

根据工程实际情况，工程建设范围内不设计拆迁安置及任何专项

设施改（迁）建问题。

1.2 项目区概况

1.2.1 自然条件

①地形地貌：永嘉县地势自西北向东南倾斜，西北部群峰峥嵘，山峦起伏，海拔在 500~1200m 之间，最高为海拔 1270.8m 的大青岗。南部是海拔不到 10m 的水网平原，地势平坦，中部丘陵相间，低山参差，海拔在 30~800m，大部分重镇都分布于南部平原和中部丘陵区。

校园基地地势基本平坦，自然环境优越，交通便捷，是办学建校的理想之地。新征用地现状地面高程为 3.60m~3.80m，经过场地平整之后，可控制在 4.5m 左右。

②水文：永嘉县位于浙江省东南部，瓯江下游北岸，四季分明，雨量充沛，无霜期长，季风气候明显，春季气温回暖较早，但不稳定，寒潮活动频繁；夏季高温期长，对流旺盛，多雷雨天气，且经常受台风系统影响，局部有洪涝，偶有泥石流和山体滑坡等地质灾害；秋季降温较慢，天气温和；冬季较短，湿度较大多雾，山区偶有冻害。

③气象：根据气象站 20 年资料统计，气象主要要素如下：

1)气温：年平均气温:17.9℃，极端最高气温:39.3℃，极端最低气温: -4.5℃，年平均最高气温:21.9℃，年平均最低气温:14.8℃。

2)降水：年平均降水量 1698.2mm，年最大降水量 2414.1mm，年最小降水量 1025.7mm，日最大降水量 247.7mm，年平均降水天数 176.8 天，年平均蒸发量 1310.5mm，年最大蒸发量 1535.0mm，年最小蒸发量 110.7mm。降雨量集中在春、夏季,46 月为梅雨期，降水量占全年 36~44%，为该地区主要汛期，其次为 89 月台风带来的雨，雨量大、强度大，降水量占全年 20~28%。

④土壤：永嘉县土壤划分为五个土类，十三个亚类，二十九个土属，五十四个土种。五个土类为红壤土类、黄壤土类、潮土土类、盐

土土类和水稻土土类，红壤土类是全县分布最广的土类，占全县山地面积的 79.9%。工程土壤类型主要有红壤和黄壤土二个大类。

⑤植被：永嘉瓯北城市新区，处于楠溪江下游，土壤类型为水稻土和潮土，工程区土地开发利用程度较高，大部分被开发为农田和城镇用地，天然植被消失，在部分道路沿线种有防护林带。工程区植被覆盖率较低。

1.2.2 水土流失及水土保持情况

根据《浙江省第五次应用遥感技术普查水土流失成果报告(2010)》统计结果数据可知，永嘉县土地总面积 267.36km²，水土流失面积 416.77km²，占土地总面积的 15.57%。水土流失以无明显、中度和强烈为主。按全国水土流失类型区划分，永嘉县属水力侵蚀为主的南方丘陵红壤区，在省级水土流失重点防治公告中，永嘉县南部的瓯北镇属省级重点监督区。项目区水土流失类型以降雨和地表径流冲刷引起的水力侵蚀为主，主要形式为面蚀，在部分丘陵区有沟蚀发生。

开工前，工程区现状主要为农田。水土流失类型主要是降水和地表径流冲刷引起的水力侵蚀，土壤侵蚀模数在 300t/km²·a 左右，属微度侵蚀区，小于工程区容许土壤流失量（500t/km²·a）。

2 水土保持方案和设计情况

2.1 主体工程设计

2.2 水土保持方案编报审批及后续设计

2012年7月上旬，永嘉县水利水电勘查设计院编制完成了本工程的水土保持方案报告书(送审稿)

2012年7月1日，永嘉县水利局召开会议对《永嘉县瓯北第五小学扩建工程水土保持方案报告书》（送审稿）组织审查。

2012年7月，永嘉县水利水电勘查设计院完成《永嘉县瓯北第五小学扩建工程水土保持方案报告书》（报批稿）。

主体工程设计单位以审批后的水土保持方案为补充，完成水土保持工程的初步设计及施工图设计。

2.3 水土流失防治责任范围

根据永嘉县水利局永水利〔2012〕198号对“永嘉县瓯北第五小学扩建工程水土保持方案报告书的批复”，项目水土流失防治责任面积为3.33hm²。其中：项目建设区面积2.94hm²；直接影响区面积0.39m²。

2.4 水土流失防治目标

依据批复的水保方案，工程水土流失防治标准执行建设类项目二级标准，具体防治目标见表2-1。

表 2-1 水土流失防治标准（至设计水平年）

防治目标	标准规定	按降雨量修正	按土壤侵蚀强度修正	按地形修正	采用目标
扰动土地整治率(%)	95				95
水土流失总治理度(%)	85	+3			88
土壤流失控制比	1		微度侵蚀为主		1
拦渣率(%)	95				95
林草恢复系数(%)	95	+3			98
林草覆盖率(%)	20	+3			23

2.5 水土保持措施和工程量

本方案水土流失防治分为3个区：I区主体工程防治区，防治责

任面积 2.6hm^2 。II 区施工场地防治区，防治责任面积 0.34hm^2 (防治责任范围在主体工程防治责任范围内)。III 区其他防治区：项目区周边的直接影响区，防治责任面积 0.39hm^2 。

各防治分区水土保持措施主要包括工程措施、植物措施和临时措施等，措施布置以防治水土流失、植被恢复、改善项目区附近生态环境、保护主体工程正常安全运行为最终目的。

已批复的方案水土保持措施总体布局情况见表 2-2。

表 2-2 批复的方案水土流失防治措施体系表

主体工程已有措施		工程措施	前期场地平整、施工围墙
		植物措施	绿化、美化
新增措施	主体工程防治区	工程措施	表土剥离及回覆、后期场地平整、弃渣外运
		植物措施	从水保角度提出建议
		临时措施	临时排水沟、简易排水沟、沉砂池、水泵抽排水、泥浆沉淀池
	施工场地防治区	工程措施	场地平整
		临时措施	填土编织袋挡墙围护、砌砖围墙、彩条布遮盖
		植物措施	撒播狗牙根草籽
		管理措施	加强预防监督管理，对散落于区内的土石进行清理
	其他防治区	管理措施	运输车辆应采取速盖或密闭式运输，运输车辆限速，运输过程严禁抛、撒、漏，防止土石散落于运输途中以及施工场地周边，并加强监督，做好防护和清理工作。

各防治区水土保持措施工程量如下：

(1) 主体工程防治区

工程措施：表土剥离 3500m^3 ，表土回填 3500m^3 ，弃渣外运 2200m^3 ；

临时措施：临时排水沟 410m，简易排水沟 138m，临时沉砂池 2 座，泥浆沉淀池 5 个，水泵系统 2 套。

(2) 施工场地防治区

工程措施：场地平整 3400m^2 ；

临时措施：彩条布遮盖 400m^2 ，填土编织袋拦挡 220m；

植物措施：撒播狗牙根草籽 0.2hm^2 。

根据已批复的水土保持方案可知，除了主体工程中具有水土保持功能的措施以外，本方案根据工程具体的施工进度和施工情况进行了各水土流失防治分区的工程措施和相应的植物措施以及临时措施设计，本工程计列工程量见汇总表 2-3。

表 2-3 本工程计列水土保持措施工程量汇总表

防治区	措施分类	具体措施	工程量
I区主体工程防治区	工程措施	表土剥离 (m ³)	3500
		表土回填 (m ³)	3500
		弃渣外运 (m ³)	2200
	临时措施	临时排水沟 (m)	410
		简易排水沟 (m)	138
		临时沉砂池 (座)	2
		泥浆沉淀池 (个)	5
		水泵系统 (套)	2
II区施工场地防治区	工程措施	场地平整 (m ²)	3400
	临时措施	砌砖墙 (m)	80
		彩条布遮盖 (m ²)	400
		填土编织袋拦挡 (m)	220
	植物措施	撒播狗牙根草籽 (hm ²)	0.2

2.6 水土保持投资

根据已批复的水土保持方案可知，本项目建设期水土保持总投资为 169.68 万元，其中工程措施 108.02 万元(主体 97.62 万元，新增 10.40 万元)，植物措施 28.04 万元(主体 28.00 万元，新增 0.04 万元)，临时措施 12.74 万元(主体 0 万元，新增 12.74 万元)，独立费用 19.16 万元，基本预备费 1.26 万元，水土保持补偿费 0.46 万元。其中主体工程设计已有投资 125.62 万元，新增投资 44.06 万元，建设期水土保持投资计入工程建设总投资。

2.7 水土保持变更

本工程施工符合规范要求，实际施工均按已批复的水土保持方案实施，未进行设计调整。

3 水土保持方案实施情况

3.1 水土流失防治责任范围

3.1.1 实际发生的水土流失防治责任范围

按照防治责任范围划分的原则和依据,同时结合本项目建设可能影响的水土流失范围,确定水土流失防治责任面积为 3.33hm^2 。其中:项目建设区面积 2.94hm^2 ; 直接影响区面积 0.39hm^2 详见表 3-1。

表 3-1 实际发生的水土流失防治责任范围表 单位: hm^2

防治责任面积		批复面积	实际面积	变化量 (实际-批复)
项目建设区	永久占地	2.94	2.94	0
	临时占地	(0.34)	(0.34)	0
	小计	2.94	2.94	0
直接影响区		0.39	0.39	0
防治责任范围	3.33	3.33	3.33	0

方案批复工程水土流失防治责任范围总面积 3.33m^2 ,其中项目建设区 2.94m^2 , 直接影响区 0.39m^2 。实际发生的水土流失防治责任范围总面积 3.33m^2 , 其中, 项目建设区 2.94m^2 , 直接影响区 0.39m^2 。水土流失防治责任范围总面积未发生变化, 直接影响区未发生变化。

3.1.2 竣工后的水土流失防治责任范围

验收后,主体建筑物、交通道路、管网及景观绿化均建设完成。施工场地在施工期末进行场平后按照设计统一进行绿化和硬化。项目区周边可能造成影响的区域在项目区排水系统完成后均不再产生影响。因此工程竣工后,水土流失防治责任范围为项目永久征地面积 2.94m^2 。

3.2 取(弃)土场

本工程根据已批复的水土保持方案实施取(弃)土方案。

(1) 本工程不单独设置取土(石、料)场,符合水土保持要求。工程所需建筑材料均采用从合法料场购买的方法解决,并在采购土石料合同中明确土石料开采及运输过程中产生的水土流失由供货方负

责，减少取土（石、料）场占地及扰动面积，有利于水土保持。

（2）本工程不另设弃土场，工程弃渣由施工单位运至和一村鱼池场地填方综合利用，不设置弃渣场。。

3.3 水土保持措施总体布局

本工程水土保持方案批复后，在后续的施工过程中，主要的防护措施基本与批复一致。但由于方案批复的水保方案为可行性研究深度，与后续施工图和实际情况存在一些差别，经建设单位、设计单位、监理单位及施工单位共同进行现场勘查，优化了原水保方案，进一步优化植物配植。

对应批复的水保方案措施设计，水土保持设计发生的主要调整如下：

对原批复的方案中对绿化景观区的植物措施进一步、细化设计，按乔、灌、草结合的方式实施，并细化到了不同的树种。

3.4 水土保持设施完成情况

本工程完成的水土保持措施工程量主要是方案中主体设计的水土保持措施。

（1）完成方案中水土措施情况措施情况

根据各分项工程的竣工结算清单，完成方案中水土措施情况统计见表 3-2。

表 3-2 完成方案批复新增的水土保持措施数量表

防治分区	措施名称	单位	合计
I区主体工程防治区	临时排水沟	m	410
	简易排水沟	m	138
	临时沉砂池	座	2
	泥浆沉淀池	个	5
	水泵系统	套	2
II区施工场地防治区	砌砖墙	m	80
	彩条布遮盖	m ²	400
	填土编织袋拦挡	m	220

(2) 水土保持工程措施实施时间

水土保持工程措施工程实施时间详见表 3-3。

表 3-3 水土保持工程措施工程实施时间表

防治分区	措施类型	2015 年	2016 年				2017 年				2018 年	
		12 月	1 月-3 月	4 月-6 月	7 月-9 月	10 月-12 月	1 月-3 月	4 月-6 月	7 月-9 月	10 月-12 月	1 月-3 月	4 月-6 月
I 区 主体 工程 防治 区	工程措施	表土剥离 3500m ³								表土回填 3500m ³		
				弃渣外运 2200m ³								
	临时措施	临时排水沟 410m, 简易排水沟 138m, 临时沉砂池 2 座, 水泵系统 2 套。										
				泥浆沉淀池 5 座								
	植物措施									景观绿化 0.65hm ²		
II 区 施工 场地 防治 区	工程措施									场地平整 3400m ²		
	临时措施	砌砖墙 80m										
		彩条布遮盖 400m ²										
	植物措施			填土编织袋拦挡 220m								
			撒播狗牙根草籽 0.2hm ²									

3.5 水土保持投资完成情况

根据已批复水土保持方案书，水土保持概算总投资 169.68 万元，其中主体已列投资 125.62 万元，方案新增 44.06 万元。其中工程措施 10.40 万元，植物措施 0.4 万元，临时措施 12.74 万元，独立费用 19.16 万元，基本预备费 1.26 万元，水土保持补偿费 0.46 万元。

结合工程实际情况，因工程水土保持监测工作由建设单位自行监测，故监测费用减少。

根据建设单位提供的各分项工程竣工结算清单，本工程建设实际完成水土保持方案总投资 161.68 万元，其中主体投资 125.62 万元，方案新增 44.06 万元。其中工程措施 10.40 万元，植物措施 0.4 万元，临时措施 12.74 万元，独立费用 11.16 万元，基本预备费 1.26 万元，水土保持补偿费 0.46 万元。

4 水土保持工程质量

4.1 质量管理体系

工程水土保持措施属于主体工程一部分，从一开始就纳入了招标投标和施工单位编制的施工组织设计中，和主体工程一同实行工程承包，与主体工程同步建设。水土保持措施与主体工程采取同样的质量管理体系。

工程在施工过程中全面实行了项目法人负责制、招标投标制和工程监理制，建立健全“项目法人负责，监理单位控制，施工单位保证，政府部门监督”的质量保证体系。水土保持工程的建设和管理纳入了整个工程的建设管理体系中。

4.1.1 建设单位质量控制体系

永嘉县瓯北第五小学作为项目法人，是工程建设质量管理的第一责任单位，其主要领导是工程质量管理的第一责任人，公司实行自上而下的领导和自下而上的负责制。公司下属工程部是负责工程质量的职能部门，在总经理领导下，由副总经理和技术负责人直接领导工程部进行日常质量管理工作。主要质量管理工作如下：

(1) 设计勘察质量管理。根据初步设计，由工程部组织对现场建构物的位置、尺寸等进行核实，提出增、减及合并方案，报设计院在施工图设计中予以合理控制。

(2) 基本建设程序管理。严格按照基本建设程序进行工程建设管理，配合建设行政主管部门完善基本建设程序工作。

(3) 帮助承包人建立完善质量保证体系。

(4) 核实驻地办履约能力。审查、核实驻地办监理人员的资质、数量是否满足要求，是否有效控制工程质量，对存在问题的监理人员责成驻地办进行处理。

(5) 驻地办的质量监控保证体系。要求驻地办进场后编制《监理工作大纲》和《施工监理实施细则》，经过审查通过后，作为监理

工作的主要依据开展监理工作。

(6) 对现场施工质量进行日常巡视检查，对检查中发现的质量问题及时与监理工程师沟通，并通过监理工程师监督承包人及时纠正。

(7) 对监理工作进行日常检查和监督，做好检查与指导相结合，教育与惩处并重。在日常管理中，侧重于对监理旁站到位、原材料及工序验收程序、质量抽查标准、施工技术方案的执行等进行检查监督，对发现的监理失职行为给予批评、通报及处罚。

(8) 会同设计代表处理日常调整设计方案，抓好竣工文件编制工作，会同监理工程师处理工程质量缺陷。

4.1.2 设计单位质量责任体系

根据工程的具体情况，配备项目设计负责人，各专业设计负责人及其他相关设计人员。设计单位所配人员的技术、专业、资质与素质均满足项目主体设计的要求。

设计单位质量责任体系实行院长统一领导的总工程师负责制度，实行“设计→校核→审查→核定→批准”的逐级责任追究制度，主要体系如下：

(1) 设计人员为单项工程设计质量的第一责任人，主要负责完成单项工程的结构布置和计算工作，保证工程布置、计算数据、设计图纸设计意图符合大纲和规程规范要求。

(2) 制图员负责正确反映勘设人员的设计意图，保证设计图纸准确无误，符合大纲和规程规范的要求。

(3) 工程设计校核人员为工程设计质量的第二责任人，主要负责全面了解勘设人员的设计意图，按照大纲和规程规范的要求，对该工程结构布置和计算方法的合理性、准确性进行分析，并逐项进行结构核算，对设计文件的编制质量实行监督，保证所校核的设计文件准确无误。

(4) 项目设计负责人为项目设计质量的总责任人，负责整个项目的设计质量的全过程管理，保证整个项目设计文件准确无误，按大纲和规程规范的要求进行设计质量控制。

4.1.3 监理单位质量保证体系

根据工程的具体情况，配备总监理工程师，专业监理工程师及其他相关监理人员。监理单位所配人员的技术、专业、资质与素质均满足水土保持工程施工监理要求。

根据监理合同，监理工程师及时进入施工现场，对施工准备工作进行监理，确定工程项目监理总工程师，并建立监理机构，编制工程项目监理规划，编制工程项目各专业监理细则，规范化开展监理工作，参与验收，签署监理意见，向业主提交工程监理档案资料，做好监理工作总结。

监理单位对施工工程的质量控制，以合同文件、设计图纸、规范规程和审批的施工组织设计及质量保证措施为依据，以单位工程为基础，以工序控制为重点，进行从准备到施工直至竣工的全过程监督。

监理单位除按监理实施细则工作，还坚持监理现场旁站、检查，总监巡视制度，发现问题及时解决，做好事前指导、中间检查、终检验收三环节的制度，并做好现场监理记录。

检查方法如下：

(1) 测量放样

要求承包人定期对工程控制点、水准点进行复测，并对复测内容进行复核；承包人每天进行的测量工作内容及记录都应于当天报施工项目部核签；每次工程开工前必须附有测量放样基础资料，对重要部位均应由专业监理工程师复核后再准予开工。

(2) 标准实验审批

各分项工程开工前督促施工单位完成相应的标准实验，监理单位及时完成标准实验的验证并审核，以确定各分项工程验收、检测的基

本指标。

（3）原材料、构配件监理

原材料、构配件的质量保证工程质量的基本前提，监理单位要求施工单位建立原材料合格入场（库）制度，对自检、抽检合格的原材料进行登记签认原材料进场报验单，并对入场（库）原材料的数量和计划使用部位进行登记，对不合格的原材料要求施工单位立即退场，并做好退场记录。

（4）首件工程认可制

要求施工单位在每个分项工程开工前首先进行该部位的工艺试验，监理人员对施工单位的工艺试验进行全过程旁站监理并做好旁站监理记录。试验结束后施工单位提交试验报告，经监理工程师审批确定后，按批准的施工方案指导施工。分项工程施工方案未批准、开工条件不具备不得批准开工。

（5）工程质量检查

监理单位通过旁站、巡视，对工程施工过程进行控制，检查施工单位的施工质量、工艺是否满足国家标准、有关规范规程、合同、设计文件等方面的要求，其中对各单位工程中各分部、分项工程施工的重要部位、薄弱环节，确定具体部位，实施旁站和现场见证。对质量问题，由监理工程师填写“监理工程师通知书”限期拆除、修补、返工、更换、检测、罚款、暂停等处理意见交施工单位。施工单位整改完，填写“复工报审表”经监理人员复查合格后，由总监理工程师审批“复工报审表”施工单位方可复工或继续施工。否则给予经济处罚，直至队伍清除现场。每道工序完成后，由施工单位填写“工程报验单”同时必须提交自检记录、分部分项质量评定表、隐蔽工程记录等，经监理工程师复验填写意见，验收合格方可进入下道工序。

（6）工程中间和竣工验收

承包单位在工程项目自检合格达到中间或竣工验收条件时，将全

部资料报监理单位，由总监理工程师组织监理人员对质量保证资料进行核查，并督促承包单位完善；当工程达到验收条件时，由总监理工程师组织各专业监理人员对各专业的质量情况、使用功能进行全面检查，发现影响验收的问题，要求承包单位整改；需要进行功能试验项目，督促承包单位及时进行试验，监理人员应认真审阅试验报告单，对重要项目须亲临现场监督，必要时请建设单位、设计单位派代表参加；参与由建设单位组织的有建设单位、监理单位、设计单位和承包单位共同对工程验收，需要局部修改的，在修改符合要求后再验，直至符合合同要求。由四方在“单位工程验收记录”上签字，并认定质量等级；竣工验收完成后，由总监理工程师和建设单位代表共同签署“竣工验收证书”并由监理单位、建设单位盖章后，送承包单位一份。

建设单位、设计单位、监理单位、质量监督单位、施工单位质量保证体系和管理制度。

4.1.4 施工单位质量控制体系

施工单位是工程质量的直接责任人，施工单位的质量自控能力和水平是保证工程质量的根本因素。施工单位必须建立“横向到边，竖向到底，控制有效”的质量自检体系，认真执行三检制度。

(1) 认真执行合同规定，确保自己的履约能力。施工单位必须按照合同规定组织工程管理技术人员和机械设备进场，项目部以项目经理为首的质量保证体系，技术负责人、质量安全部、工程质检员和工程安全员分级管理，加强对质量工作的组织领导。

(2) 建立完善的质量保证体系。施工单位确立主要管理技术人员，建立完善的质量保证体系，要求必须明确的组织机构、人员分工和明确的责任制度。要求施工单位必须建立施工现场质量自检负责制度和质检员验收的双重质量体系。要求做好质检人员到位，质检责任明确，质检制度落实。

(3) 要求施工单位必须建立自己的质量奖惩制度和处理措施。

对自检、监理检查、业主检查所发现的问题责任人必须采取必要的奖罚处理措施，以调动工程技术人员质量管理的积极性，提高责任感。注重对一线操作人员的质量再教育、技能再提高工作，进一步落实质量责任追究制度，提高质量创优的自觉性和紧迫性。

(4) 制定精细管理实施方案，“精”在工程建设管理的质量上，“细”在建设管理的行为上。突出源头管理，注重程序控制，强化过程监督，规范施工行为，精细组织，精细施工。

4.1.5 质量监督单位管理体系

本工程质量由永嘉县质量监督站实施政府监督。

质量监督站依据国家有关法规和建筑规范规程，及质量检验评定标准，对工程质量进行强制性的监督管理。建设单位、设计单位、监理单位和施工单位在工程实施阶段都必须接受质量监督站的监督。质量监督站着重检查建设各方的质量管理体系和质量行为。派监督人员到现场巡视、抽查工程质量，针对施工中存在的质量问题提出整改意见。对监理、设计、施工单位的资质进行复核。对建设、监理单位的质量检查体系和施工单位的质量保证体系以及设计单位的现场服务等实施监督检查。监督检查技术规程、规范和质量标准的执行情况。检查施工单位、建设单位、监理单位和设计单位对工程质量检验和质量评定情况。参加单位工程、分部工程及重要隐蔽工程和关键部位的工程验收，核定工程等级。

4.1.6 施工事故及处理

通过监督单位、建设单位、监理单位、设计单位、施工单位的认真、负责、公正、有效的工作，工程质量管理方面产生了良好的效果，水土保持措施全部合格，无重大水土流失事件发生。

4.2 各防治分区水土保持工程质量评价

4.2.1 工程项目划分及结果

根据水土保持质量评定规程（SL336-2006），并结合工程实际水

水土保持措施实施情况及监理单位、施工单位提供的相关资料，将本项目实施的水土保持工程划分为：临时防护工程、植被建设工程等 2 个单位工程和 5 个分部工程以及 8 个单元工程。

具体划分见表 4-1 水土保持工程划分。

表 4-1 水土保持工程划分

单位工程	分部工程	单元工程	单位	工程量	划分标准	数量
临时防护工程	沉沙	临时沉砂池	m ³	28	30	1
		泥浆沉淀池	座	2	1	2
	排水	临时排水沟	m	410	100	5
		简易排水沟	m	138	100	2
	覆盖	彩条布遮盖	m ²	400	100	4
	拦挡	砌砖墙	m ³	80	100	1
		填土编织袋拦挡	m ³	220	100	3
植被建设工程	点片状植被	景观绿化	m ²	0.85	1	1
合计						

4.2.2 各防治区工程质量评价

(1) 质量评定标准

质量评定以分部工程评定为基础，评定等级分为优良、合格两级。

分部工程质量评定合格标准为：①单元工程全部合格；②中间材料质量全部合格。优良标准为：①单元工程全部合格，其中有 50% 以上达到优良，主要单元工程及关键部位的单元工程质量优良，且未发生任何质量事故；②中间材料质量全部合格，其中砼拌和物质量达到优良。

单位工程质量评定合并标准为：①分部工程全部合格；②中间材料质量全部合格；③外观得分率达到 70 分以上；④施工质量检验资料齐全。优良标准为：①分部工程全部合格，其中有 50% 以上达到优

良，主要工程质量优良，且未发生任何质量事故；②中间材料质量全部合格，其中砼拌和物质量达到优良；③外观得分率达到 85 分以上；④施工质量检验资料齐全。

工程质量评定合格标准为：单位工程全部合格；优良标准为：单位工程全部合格，其中有 50%以上达到优良，主要单位工程质量优良。

（2）质量评定组织

单元工程质量由施工单位质检部门组织评定，监理单位复核；分部工程质量评定在施工单位质量部门自评的基础上，由监理单位复核，报质量监督机构核备；单位工程质量评定在施工单位自评的基础上，由监理单位复核，报质量监督机构核定。整个工程的质量评定由项目质量监督站在单位工程质量评定的基础上进行核定。

（3）质量评定结果

工程措施的分部工程质量评定是在分部工程竣工验收意见的基础上。由业主和监理单位组成评定小组，对工程的建设过程和运行情况进行考核，根据施工记录、监理记录、外观质量、工程缺陷和管理清理等进行综合评定。参与质量评定的各方，本着认真、公正、负责的原则，对工程建设中的各项水土保持工程给予了公正的评定。

植物措施的分部工程质量评定由建设单位直接验收，以成活率、保存率为主要评定依据。根据本地区气候条件，植物成活率达 95%，保存率达 90%为优良；植物成活率达 90%，保存率达 95%为合格。

本工程水土保持工程措施、植物措施各分部工程质量评定均达到合格标准。

水土保持工程质量评定结果见表 4-2。

表 4-2 水土保持工程质量评定结果见

单位工程	分部工程	单元工程	质量等级
临时防护工程	沉沙	临时沉砂池	合格
		泥浆沉淀池	合格
	排水	临时排水沟	合格
		简易排水沟	合格
	覆盖	彩条布遮盖	合格
	拦挡	砌砖墙	合格
		填土编织袋拦挡	合格
植被建设工程	点片状植被	景观绿化	合格

4.3 总体质量评价

综合以上质量评定结果，本工程各单元工程、分部工程实施的水土保持措施项目运行状况良好，临时防护工程和植被建设工程相结合的情况下，能有效地防治水土流失，满足水土保持要求，本工程的水土保持措施质量合格。

5 工程初期运行及水土保持效果

5.1 运行情况

“永嘉县瓯北第五小学扩建工程”水土保持设施已经基本建成，目前项目已进入运行期，现水土保持工程随同主体工程一并移交永嘉县瓯北第五小学管理、养护。

各项水土保持工程建成运行后，在经历暴雨、台风等恶劣天气下运行正常，其安全稳定性良好。项目区林草长势良好，基本上达到了水土流失防治预期效果。

5.2 水土保持效果

5.2.1 水土流失治理

在工程施工期间，水土流失防治责任范围内的地表均受到受到不同程度的扰动，通过各项整治工程和水土保持防治措施的实施，项目区内水土流失基本得到了控制，水土流失防治目标均达到了规定的目标值。

项目扰动土地总面积 2.94m^2 ，采取了有效的水土保持措施后，扰动土地整治率达 100%；工程建设结束后，随着主体工程中具有水土保持功能工程的完工以及各项水保措施的实施，除项目区构建筑物、校园道路和活动广场区域外，工程建设可能造成水土流失 0.65hm^2 面积得到了相应治理，工程建设带了的的水土流失得到了有效控制，水土流失总治理度为 100%；通过对堆场采取有效防护措施，表土基本被拦挡，水土流失大大减少，项目拦渣率达到 99.9%；通过现场调查，植被覆盖度，结合土壤侵蚀分类分级标准，确定抽样地段现状的土壤侵蚀模数为 $300\text{t}/(\text{km}^2\cdot\text{a})$ 以下，土壤侵蚀容许值 $500\text{t}/(\text{km}^2\cdot\text{a})$ ，土壤流失控制比为 1.0。

5.2.2 生态环境和土地生产力恢复

(1) 林草植被恢复率

工程水土流失防治责任范围内，林草植被可恢复面积 0.65hm^2 ，

经调查目前完成林草植被恢复达标面积 0.65hm²，总体林草植被恢复率 100%，满足批复水土保持方案确定的 98%的防治目标要求。

工程林草植被恢复率统计表见表 5-1。

表 5-1 工程林草植被恢复率统计表

工程防治分区	可恢复植被面积 (hm ²)	林草植被恢复面积 (hm ²)	林草植被恢复率%		评估结论
			效果值	目标值	
主体工程防治区	0.65	0.65	100	98.0	达标
综合目标	0.65	0.65	100	98.0	达标

(2) 林草覆盖率

工程竣工后，项目区内已实施的绿化面积为 0.65hm²，总体林草覆盖率达 23.38%以上。

工程林草覆盖率统计表见表 5-2。

表 5-2 工程林草覆盖率统计表

工程防治分区	项目建设区面积 (hm ²)	林草面积 (hm ²)	林草覆盖率%		评估结论
			效果值	目标值	
主体工程防治区	2.78	0.65	23.38	23	达标
综合目标	2.78	0.65	23.38	23	达标

(3) 土地恢复情况

施工临时位于红线范围内。施工结束后，施工场地经拆除场地内临时建筑、疏松被压实的地表并清理场地后通过进行场地平整。目前，施工场地临时占用区域为活动广场。

5.2.3 公众满意度调查

工程建设过程中与周边关系处理融洽，在整个施工过程中未接到有关本工程的水土保持投诉。

6 水土保持管理

6.1 组织领导

我单位作为本工程的建设主管单位，积极根据《中华人民共和国水土保持法》中的“谁建设、谁保护，谁造成水土流失、谁负责治理”的原则，组织实施工程中相关的水土保持工程。在工程建设过程中，我单位将有关水土保持工程及要求纳入主体工程建设计划中，规范水土保持工程施工，并积极与永嘉县水行政主管部门联系，接受其监督指导。

6.2 规章制度

在工程建设初期，建设单位就制定了以目标管理为核心的一系列规章制度，形成了施工、监理、设计、建设各司其职，密切配合的合作关系，并制定实施、检查、验收的具体方法和要求，明确质量责任，防范建设中不规范的行为的发生。水土保持方案批复后，建设单位积极协调水土保持方案与主体工程的关系，以保证各项水土保持措施顺利实施。

6.2.1 施工组织制度

(1) 项目经理责任制

各施工单位均成立了项目部，由项目经理全面负责工程施工安排、施工技术方案与措施制定、合同管理、施工质量管理、施工测量与放样、安全与文明施工管理、材料与设备管理等，通过实行项目部的管理体制，保证水土保持工程的顺利实施。

(2) 教育培训制度

工作中加强水土保持的宣传、教育工作，提高各施工承包商和各级管理人员的水土保持意识。同时做好全体人员的质量教育工作，提高质量意识，使全体人员牢固树立质量第一的观念。为保证施工安全。对全部进场员工进行了安全培训教育，自觉遵守安全生产的各项规章制度。

（3）技术保障制度

要求各施工单位配备足够的技术力量和施工机械设备，每个工序开始前设计详细的施工方案和操作细则，编制切实可行的施工进度计划。并选派经验丰富、能力强、技术水平高的个人技师负责班组施工技术工作。

6.2.2 质量控制制度

按国家有关法律、法规的规定，建设工程质量实行建设单位负责、施工单位保证、监理单位控制、建设行政主管部门监督的质量管理体系。施工单位建立质量保证体系。履行“三检制”，严格执行施工规范、操作规程。监理单位编制监理实施细则，落实各项监理工作制度，执行验收标准。建设单位以有关法律、法规、设计文件、合同文件作为质量控制依据，对影响工程质量全局性的、重大的问题进行严格控制。

6.2.3 安全生产制度

施工单位从进场开始就高度重视安全生产问题，项目部成立安全生产领导小组，贯彻“安全第一、预防为主”的工作方针，配备专职安全员，各作业队配备兼职安全员。建立了自上而下的安全生产管理体系，决策层、管理层和施工单位都有明确的安全生产责任制；建立健全各种环境下安全规章制度，坚持持证上岗，严禁无证操作，违章作业，安全设施和安全防护用品必须配备齐全，工人必须佩戴规范的安全防护用品；项目部坚持安全检查，采取定期与不定期相结合进行检查屏蔽，以讲究实效的安全检查，把事故隐患消灭在萌芽状态。

6.2.4 环境保护制度

对所有施工人员进行保护生态环境的宣传教育工作，明确了开展水土保持工程施工的本事即为环保工作。在施工过程中要求建立环境保护责任制度，把环境保护工作纳入工作计划，并采取有效的措施防止施工过程中产生的废水、粉尘、噪声和弃渣等污染危害周围的生态环

境。

6.3 建设过程

6.3.1 招投标及管理

坚持水土保持与主体工程“同时设计、同时施工、同时投产使用”的制度，始终随着主体工程同步建设。水土保持工程没有单独招标，而是将其建设内容纳入主体工程建设按主体建设工程进行标段划分，进入标段工程量进行招标施工。标书的合同工程量主要内容为固定工程量，施工中需要采取的临时防护工程没有写入合同工程量，但对水土保持要求和施工中应采取的措施明确写入了合同，制定了考核办法和奖罚措施。

为了做好水土保持工程的质量、进度、投资控制，将水土保持工程施工材料采购、施工单位招标程序也纳入了主体工程管理程序中，实行了项目法人负责、监理单位控制、承包商保证和政府监督的质量保证体系。各施工单位通过招标、投标承担水土保持工程的施工，具有施工资质、具备一定的技术、人才和经济实力，自身的质量保证体系也较为完善。监理单位具有相当工程建设监理经验和业绩，能够独立承担监理业务。

6.3.2 合同执行情况

本工程水土保持项目的施工合同与主体工程的其余部分一并签订。

在工程实施过程中，各施工单位以招投标文件和施工合同为依据，按照有关技术规范和合同要求进行施工，认真履行合同，在防治工程建设可能产生的水土流失方面做了大量的工作。

6.3.3 施工材料采购与供应

工程所需的建筑材料均从市场采购，并具有“出厂质量保证书”，监理单位对工程上使用的钢筋、水泥、砂石、防水卷材等原材料均进行了复试，检验复试合格后方投入使用。

工程建设过程中严把材料质量关、承包商施工质量和监理单位监理关，注重措施成果的检查验收工作，将价款支付同竣工验收结合起来。保障了水土保持工程质量与林草措施成活率、保存率。

6.4 监测监理

项目的水土保持工程与主体工程一起委托中国建筑技术集团有限公司负责进行了全过程的监理，确保水土保持措施与主体工程同步实施。

在工程实际施工过程中，建设单位、施工单位、监理单位高度重视，确保各项水土保持设施与主体工程同时设计、同时施工和同时竣工验收投产使用的“三同时”制度的落实，对拦挡防护措施的完好程度、植被生长恢复情况、施工区域水土流失情况等定期进行实地调查，对不足之处结合当地水行政主管部门的监督检查意见及时整改。由于水土流失防治工作均落实得力，工程施工期间未发生重大水土流失事件。

6.5 水行政主管部门监督检查意见落实情况

工程建设期间，永嘉县水利局多次到工地进行监督检查和帮助指导，协助做好防治责任范围内的水土保持工作，对完成本工程的水土保持工作起到了积极有效的作用。

6.6 水土保持补偿费缴纳情况

根据永嘉县水利局下发《关于永嘉县瓯北第五小学扩建工程水土保持方案的批复》文件（永水利〔2012〕198号），本工程应缴纳水土保持补偿费 0.46 万元。目前，建设单位已如数缴纳。

6.7 水土保持设施管理维护

工程水土保持工作不仅包括各项水土保持措施的落实和实施，也包括水土保持措施建成运行后的设施维护，采取相应的技术保障措施。

本工程水土保持设施管理机构为永嘉县瓯北第五小学，需要配备

专门的人员队伍并切实制定相应的水土保持维护制度，保证水土保持措施建成后的运行效果。绿化工程施工时，应注意加强植物措施的后期抚育工作，抓好林草抚育和管护，确保各种植物的成活率，尽早发挥植物措施的水土保持效益。定期或不定期地对已验收的水土保持工程进行检查，随时掌握其运行状态，保证工程完好。

7 结论及下阶段工作安排

7.1 自验结论

根据工程采取的防护措施，并参考监理单位对项目分部工程的质量评定，“永嘉县瓯北第五小学扩建工程”的各项水土保持设施均能满足批复水土保持方案确定的防治目标要求，总体上已具备了竣工验收的条件和要求。

7.2 下阶段工作安排

7.2.1 水土保持工程的移交使用

工程水土保持设施竣工验收后，将随同主体工程一并移交永嘉县瓯北第五小学，并由学校负责工程移交后的管理、养护责任。

7.2.2 需要完善的水土保持工作

虽然水土保持各项措施已基本完成，各项指标均能满足批复水土保持方案确定的防治目标要求，但是仍存在少量问题，现场绿化措施不够完善，存在少量裸露地面，建议建设单位对裸露区域尽快绿化和补植，以减少水土流失，同时，注重防护措施后期的管护，使水土流失防治达到规定标准，并对其它防治薄弱环节改善。

同时，要进一步管理，系统总结本工程水土保持实施的有关经验、建设和管理模式，为今后的开发建设项目水土保持工程提供可借鉴的经验，做到建设项目和水土保持工作同步发展。

永嘉县瓯北第五小学扩建工程水土保持大事记

1、2012年7月上旬完成《永嘉县瓯北第五小学扩建工程水土保持方案报告书》（送审稿）；

2、2012年7月11日，永嘉县水土保持监督管理站会议室对《永嘉县瓯北第五小学扩建工程水土保持方案报告书》（送审稿）组织审查；

3、2012年7月完成《永嘉县瓯北第五小学扩建工程水土保持方案报告书》（报批稿）；

4、2012年7月30日，永嘉县水利局印发《关于永嘉县瓯北第五小学扩建工程水土保持方案报告书的批复》（永水利〔2012〕198号）；

5、2015年12月，工程开工后，建设单位自行开展水土保持监测工作；

6、2018年6月，永嘉县瓯北第五小学自行编制完成《水土保持监测总结报告》；

7、2018年10月，浙江立诚水利工程技术有限公司编制完成《水土保持验收报告》。

附件：

1、初步设计的批复；

永嘉县发展和改革局文件

永发改审（2012）4号

关于瓯北第五小学二期扩建工程 初步设计的批复

永嘉县瓯北第五小学：

瓯北第五小学二期扩建工程初步设计业已经浙江天然建筑设计有限公司编制完成。2011年2月22日由我局牵头组织有关部门对该项目初步设计进行了审查，现将有关事项批复如下：

一、该项目初步设计深度基本符合要求，原则同意进入下步施工图设计。

二、该项目选址于现瓯北第五小学校园内。

三、建设规模及主要内容：扩建建筑面积 5659.64 m²，其中：综合楼 2134.89 m²，体育馆 3361.81 m²，门卫房 37.94 m²，主席台 125 m²，200M 环形塑胶操场一座及道路、给排水、供电、绿化等附属配套设施。

四、建筑与结构

- 1、原则同意该项目的建筑及结构设计；
- 2、在下部设计阶段结合地堪资料进一步优化基础设计；

3、建议对节能设计进一步完善，建筑材料要求选用节能环保材料；

4、请设计单位根据有关部门提出的合理化意见在施工图阶段给予完善。

五、消防、安全、环保必须做到“三同时”。

六、概算投资及资金来源：该项目概算总投资为 2388 万元，所需资金县财政 796 万元，瓯北筹 1592 万元。

七、根据《浙江省人民政府办公厅转发省发改委关于做好全省投资项目管理信息系统运行工作意见的通知》（浙政办发〔2009〕172 号）要求，请相关职能部门在完成该项目审批事项后及时录入相关审批信息，请项目单位在项目符合《国务院办公厅关于加强和规范新开工项目管理的通知》（国办发〔2007〕64 号）要求的八项开工条件后，及时录入实施进展信息。

特此批复

二〇一二年一月六日



主题词：社会事业 教育 初设 批复

抄送：县府办、教育局、财政局、住建局、国土资源局、
环保局、统计局、瓯北城市新区管委会

永嘉县发展和改革局办公室

2012 年 1 月 6 日印发

2、水土保持方案批复；

永嘉县水利局文件

永水利〔2012〕198号

关于永嘉县瓯北第五小学扩建工程 水土保持方案的批复

永嘉县瓯北第五小学：

你校委托永嘉县水利水电勘测设计院编制的《永嘉县瓯北第五小学扩建(前身焦头小学)工程水土保持方案报告书》(报批稿)悉。经组织评审及研究，批复如下：

一、该项目位于永嘉县瓯北东瓯街道和一村，地块东南侧为在建的园区大道，东北侧为已有水泥路，西南侧为规划道路，属于水土流失省级重点监督区，水土流失防治责任范围面积共计3.33公顷。工程建设扰动地表面积2.94公顷，损坏水保设施面积0.23公顷。本工程土石方开挖量0.62万立方米，填土方量2.05万立方米，借方1.65万立方米。工程建设施工期是本工程水土流失最严重的时段，如不采取严

格的水土流失防治措施，势必造成水土流失和影响周边生态环境，因此做好工程建设中的水土保持工作十分必要。

二、同意水土流失预测的时段划分、内容、方法及预测结果，本工程建设引起的水土流失总量为 244.175 吨，新增水土流失总量为 223.835 吨。

三、同意水土流失防治责任范围分为工程项目建设区和直接影响区，其中项目建设区面积为 2.94 公顷，直接影响区面积为 0.39 公顷。

四、同意水土保持方案设计深度为可行性研究阶段。开发建设项目的初步设计，应当依据水土保持技术标准和经批准的水土保持方案，编制水土保持篇章，落实水土流失防治措施和投资概算。初步设计审查时应当有水土保持方案审批机关参加。

五、同意水土流失防治区及水土保持措施的总体布局。水土流失防治区分为三个区：即主体工程防治区、施工场地防治区、其他防治区。

六、同意水土流失监测地段、内容、方法及监测方案的组织实施，项目具体监测实施方案与季报须及时报县水利局水土保持办公室备案。

七、原则同意水土保持投资估算的编制原则和方法，本工程水土保持措施的总投资为 169.68 万元，其中主体工程

已设计的水土保持投资为 125.62 万元，新增水土保持投资 44.06 万元。其中水土保持设施补偿费 0.46 万元，由永嘉县水利局收取。

八、该项目水保监理须在主体工程监理合同签订时同时约定；水土保持方案如有变更，须报我局同意；水土保持方案实施的监督检查由永嘉县水利局负责；工程竣工，由我局组织对水土保持设施进行专项验收。

二〇一二年七月三十日



主题词：水土保持 方案 批复

抄送：县住建局、教育局、环保局，瓯北经发局、瓯北建设局，江北街道，县水利水电勘测设计院。

永嘉县水利局办公室

2012年7月30日印发

责任科室：水政与行政审批服务科

3、水土保持补偿费缴纳依据;

浙江省政府非税收入一般缴款书(回单)2 (100)

行政区划码: _____ No 0008251036

执收单位编码: 510101 2012年7月23日 收缴分离 集中缴缴

执收单位名称: 水利局

付款人	全称	永嘉县教育局瓯北学区	收款人	全称	永嘉县财政局非税收入征收汇缴专户
	账号	33001627664059888114		账号	201000019840114
	开户银行	建行永嘉清泰支行		开户银行	永嘉农村合作银行
非税收入项目(执收码)		单位	数量	收缴标准	金额
0371300 水土保持设施		元/亩	2300	2	4600.00
转账 <input type="checkbox"/> 现金 <input type="checkbox"/> 人民币金额(大写) 肆仟陆佰元整					4600.00
备注: 注: 永嘉县瓯北第五小学扩建工程					
单位主管	会计	复核	记账	复核	记账
			银行盖章	出清	

验证码: _____

以转账方式付款时, 本缴款书付款期为10天(节假日顺延), 过期无效。

2010年12月 * 60000元 * 25份 * 5张

银行收款后由缴款人提供收单位

4、重要水土保持单位工程自验核查照片；



主体建筑物



道路及绿化




活动操场




附图01-项目区地理位置图

瓯北第五小学



总平面图 1:500

0 10 20 30 40

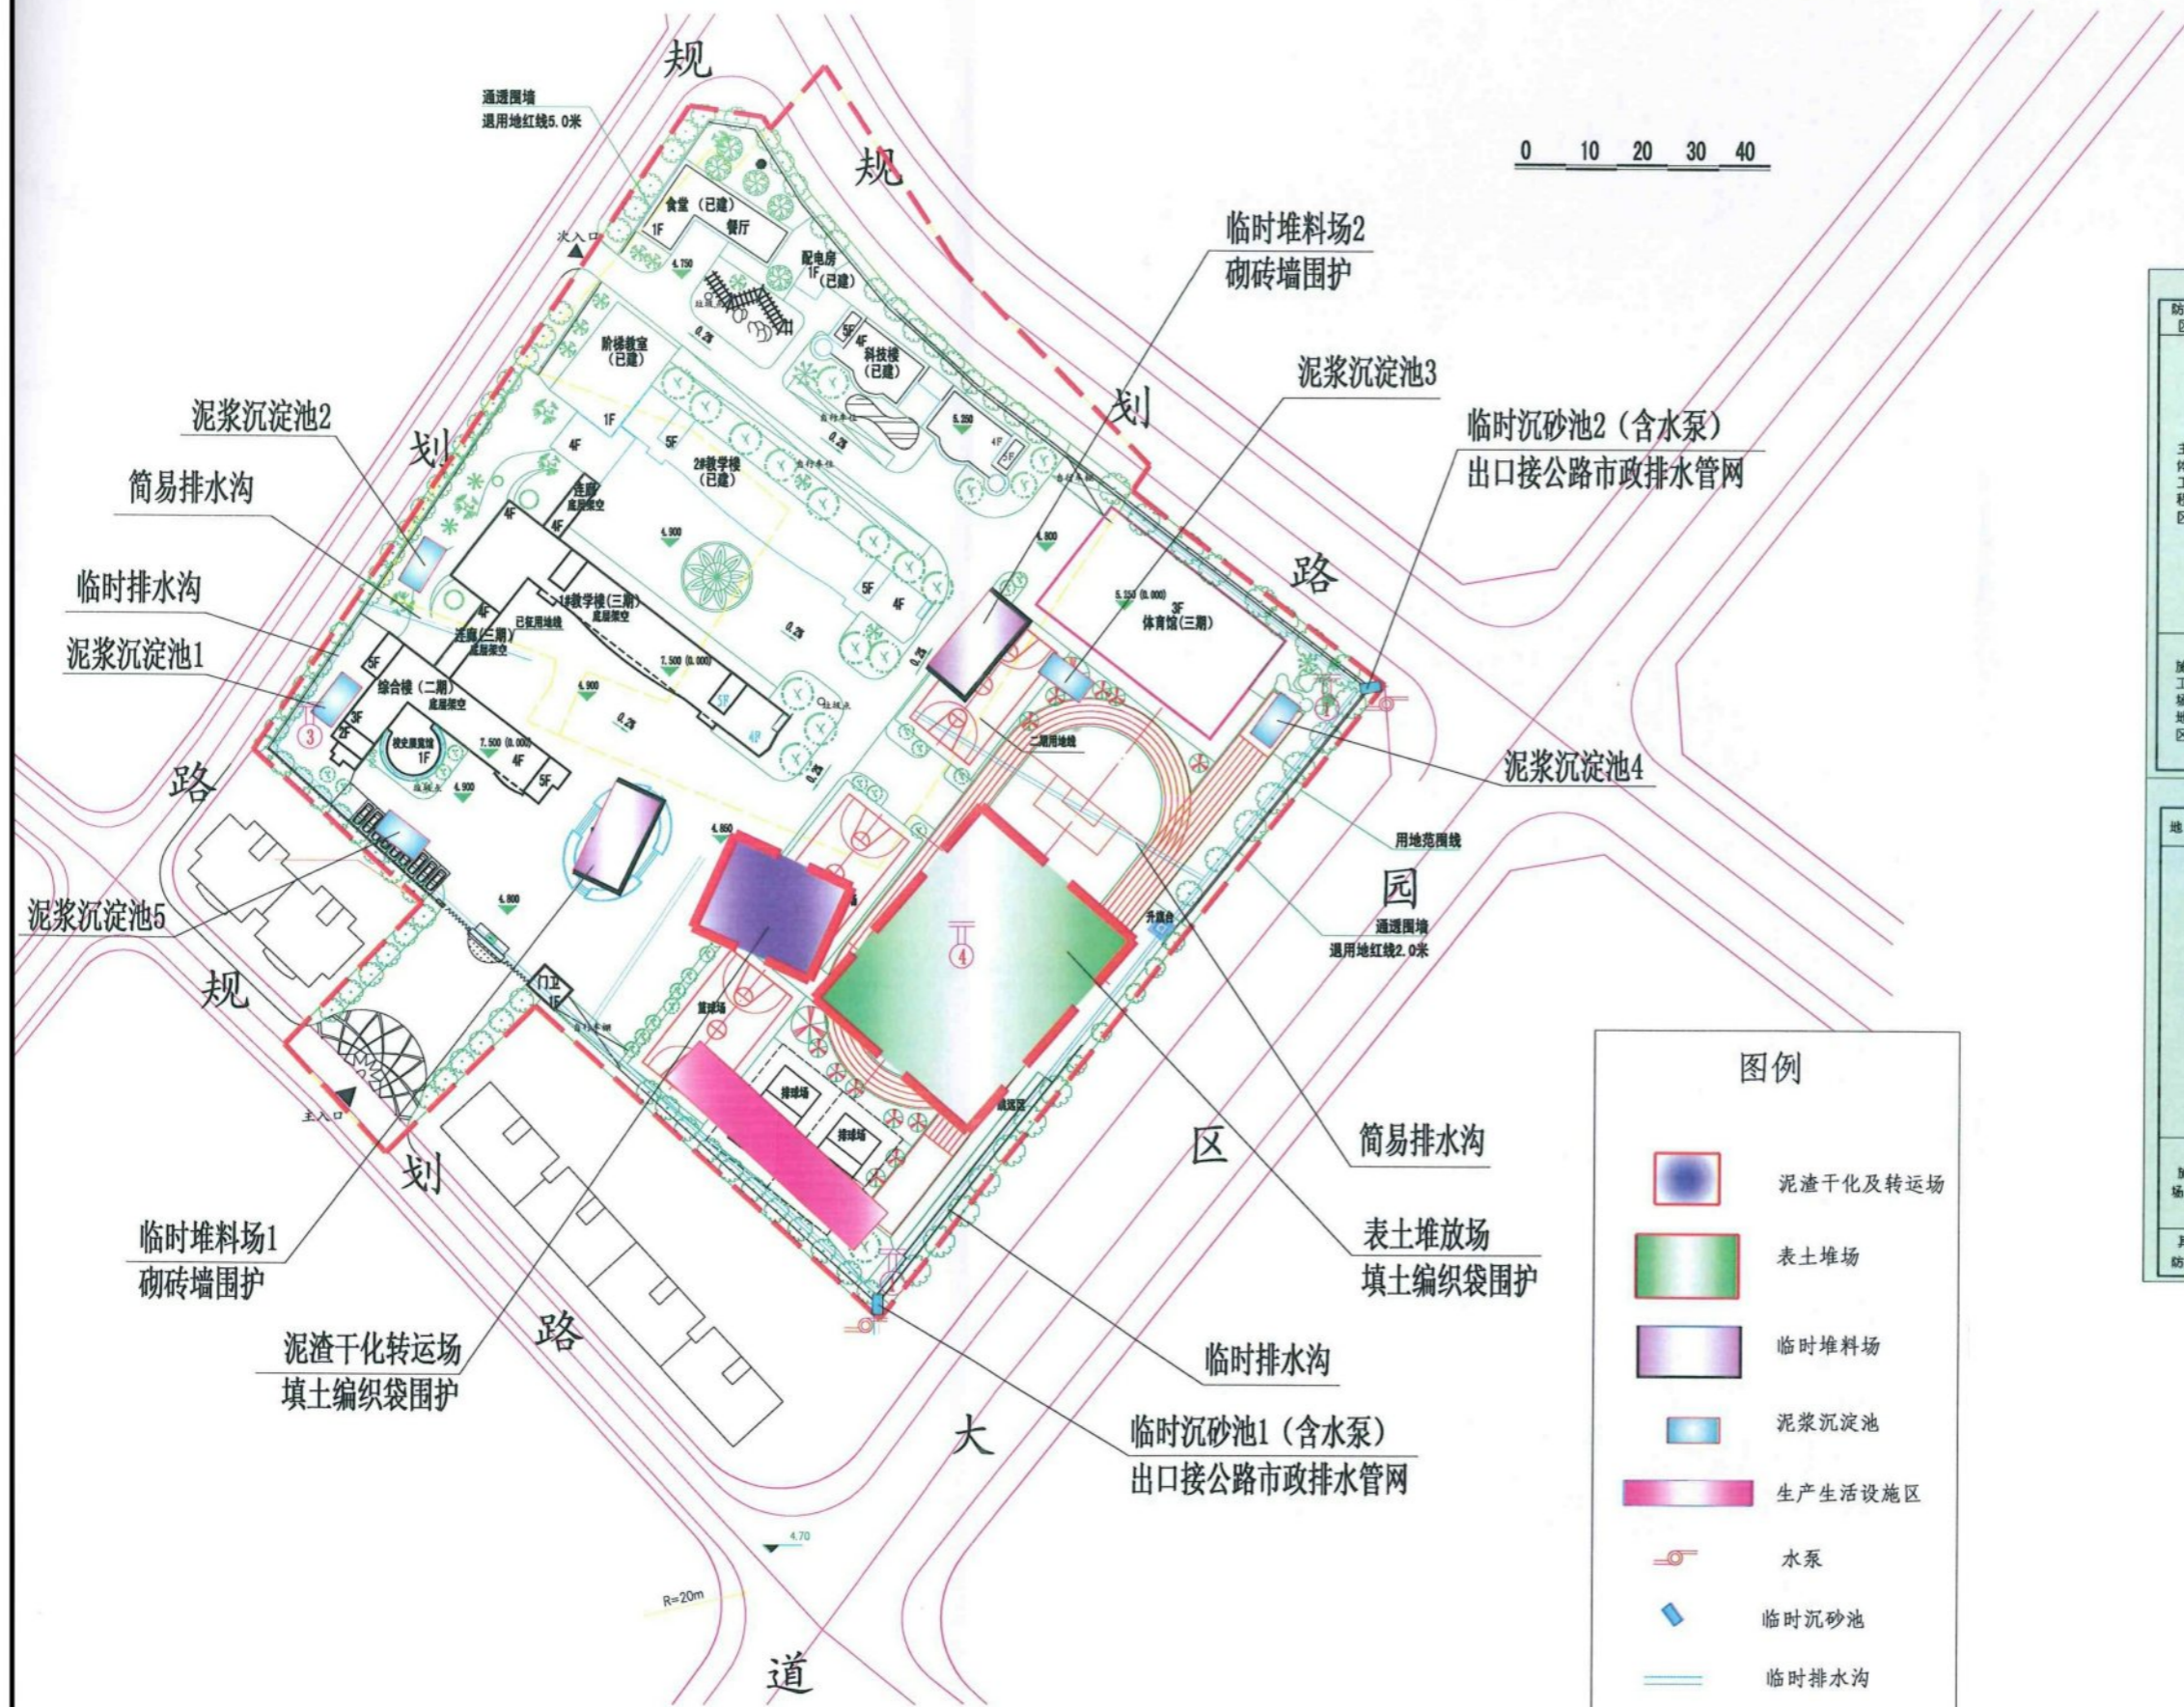

防治区	措施分类	具体措施	工程量	
主体工程区	工程措施	表土剥离 (m³)	74kw 推土机推土 50m (m³) 3500	
		表土回覆 (m³)	挖掘机挖装自卸汽车运输 100m (m³) 3500	
		弃渣外运 (m³)	挖掘机挖装自卸汽车运输 1km (m³) 2200	
	临时措施	排水沟土方开挖 (m³)	排水沟土方开挖 (m³) 240	
		临时排水沟 (410m)	钢筋基础 (m²) 175	
			2cm厚 M7.5 砂浆抹面 (m²) 492	
		简易排水沟 (138m)	排水沟土方开挖 (m³) 19	
			沟槽土方开挖 (m³) 28	
		临时沉砂池 (2座)	钢筋基础 (m²) 12	
			2cm厚 M7.5 砂浆抹面 (m²) 40	
		泥浆沉淀池 (5个)	人工开挖沟槽土方 (m³)	125
			填土编织袋填筑 (m³)	112.5
			填土编织袋拆除 (m³)	112.5
			简易排水沟 (m³)	40
			水泵 (2套)	水泵 (套) 2
		施工场地区	场地平整 (0.34ha²)	推土机平整场地 (m²) 3400
砌砖墙 (80m)	砌砖墙 (m²) 20			
彩条布遮盖	彩条布 (m²) 400			
填土编织袋挡墙 (220m)	填土编织袋填筑 (m³) 220			
植物措施	撒播狗牙根草籽 (0.20ha²)	撒播狗牙根草籽 (ha²) 0.20		

地段	项目	方法	时间		备注
			建设期	自然恢复期	
主体工程区	水土流失量	沉砂池法	至少每月监测记录 1 次, 遇暴雨、大风及时加测		设 2 个监测点, 编号为 1、2
	水土保持措施建设情况	现场调查法、巡查	每 10 天监测记录 1 次;		
	拦挡防护设施完好率	现场调查法、巡查	每 1 个月监测记录 1 次;		
	主体工程建设进度、水土流失影响因素、植物生长情况	标准样地法	每 3 个月监测记录 1 次;		设 1 个监测点, 编号为 3
	水土流失灾害事件		灾害发生后一周内完成监测		
	水土流失防治责任落实情况		不定期		
施工场地区	拦挡防护设施完好率	现场调查法、巡查	每 1 个月监测记录 1 次;		
	水土流失量	桩钉法	至少每月 1 个月监测记录 1 次, 遇暴雨、大风及时加测		设 1 个监测点, 编号为 4
其他防治区	拦挡防护设施完好率	现场调查法、巡查	每 1 个月监测记录 1 次;		

注: 本图中采用的标高为 1985 国家高程基准。
本图中采用的坐标为温州市独立坐标系。

图例

- 泥渣干化及转运场
- 表土堆场
- 临时堆料场
- 泥浆沉淀池
- 生产生活设施区
- 水系
- 临时沉砂池
- 临时排水沟
- 监测点

附图02-水土流失防治责任范围及防治措施布置图



附图03-工程建设前后遥感卫星图
